

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
4	木曽川	工作物	左 右	8.2K+130 8.2K+243	弥富市小島町 桑名市長島町押付	—	工A-1 尾張大橋
7	木曽川	堤体漏水 越水・溢水 基礎地盤漏水	右	8.0K+80 から 8.4K+110	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町押付	430	A4、B14、B15、B16
8	木曽川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	右	11.2K から 11.6K+40	桑名市長島町西川	490	A4、B18、要12

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
4	木曽川	堤体漏水	右	8.4k+110 から 11.6k+40	桑名市長島町押付 桑名市長島町西川	3,138	堤防の脆弱性 すべり破壊

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	木曽川	堤体漏水	左	0.0k から 0.4k+160	桑名市長島町老松	560	河積不足 (積土のう工)
14	木曽川	基礎地盤漏水	右	8.0K+ 35 から 8.4K	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町押付	280	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
15	木曽川	堤体漏水	右	8.0k+80 から 8.4k+110	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町小島	430	断面不足
16	木曽川	越水・溢水	右	8.0k+80 から 8.4k	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町押付	229	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)
17	木曽川	基礎地盤漏水	右	8.4k+110 から 8.8k	桑名市長島町小島	300	パイピング破壊
18	木曽川	基礎地盤漏水	右	11.2k から 11.6k+40	桑名市長島町小島 桑名市長島町西川	485	パイピング破壊

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	木曽川	工 作 物	左	8.2K+130	弥富市小島町	—	桁下不足
			右	8.2K+243	桑名市長島町押付		尾張大橋

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	木曽川	工 作 物	左	8.4K+ 32.8	弥富市小島町	—	桁下不足
			右	8.4K+ 14.5	桑名市長島町押付		近鉄木曽川橋

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞


図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
8	木曽川	旧 川 跡	右	0.0k+0 から 1.6k+0	桑名市長島町浦安 桑名市長島町松陰	1,620	三川分流工事で干拓
9	木曽川	新 堤 防	右	1.0k から 3.0k+207	桑名市長島町横満蔵	3,129	R4木曽川横満高潮堤防嵩 上工事 R6.3完成
10	木曽川	旧 川 跡	右	3.0k-40 から 3.4k+120	桑名市長島町浦安 桑名市長島町松陰	570	三川分流工事で締切
11	木曽川	旧 川 跡	右	5.8k+0 から 6.0k-40	桑名市長島町浦安 桑名市長島町松陰	170	三川分流工事で締切
12	木曽川	旧 川 跡	右	11.4k+0 から 11.6k+40	桑名市長島町新所	280	三川分流工事で締切

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞


(重要度B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重 複 番 号)
4	木曽川	法崩れ・すべり (裏)	右	9.6k ～ 10.2k	桑名市長島町大倉 桑名市長島町小島	510	

木曾川 0.0k ~ 2.6k

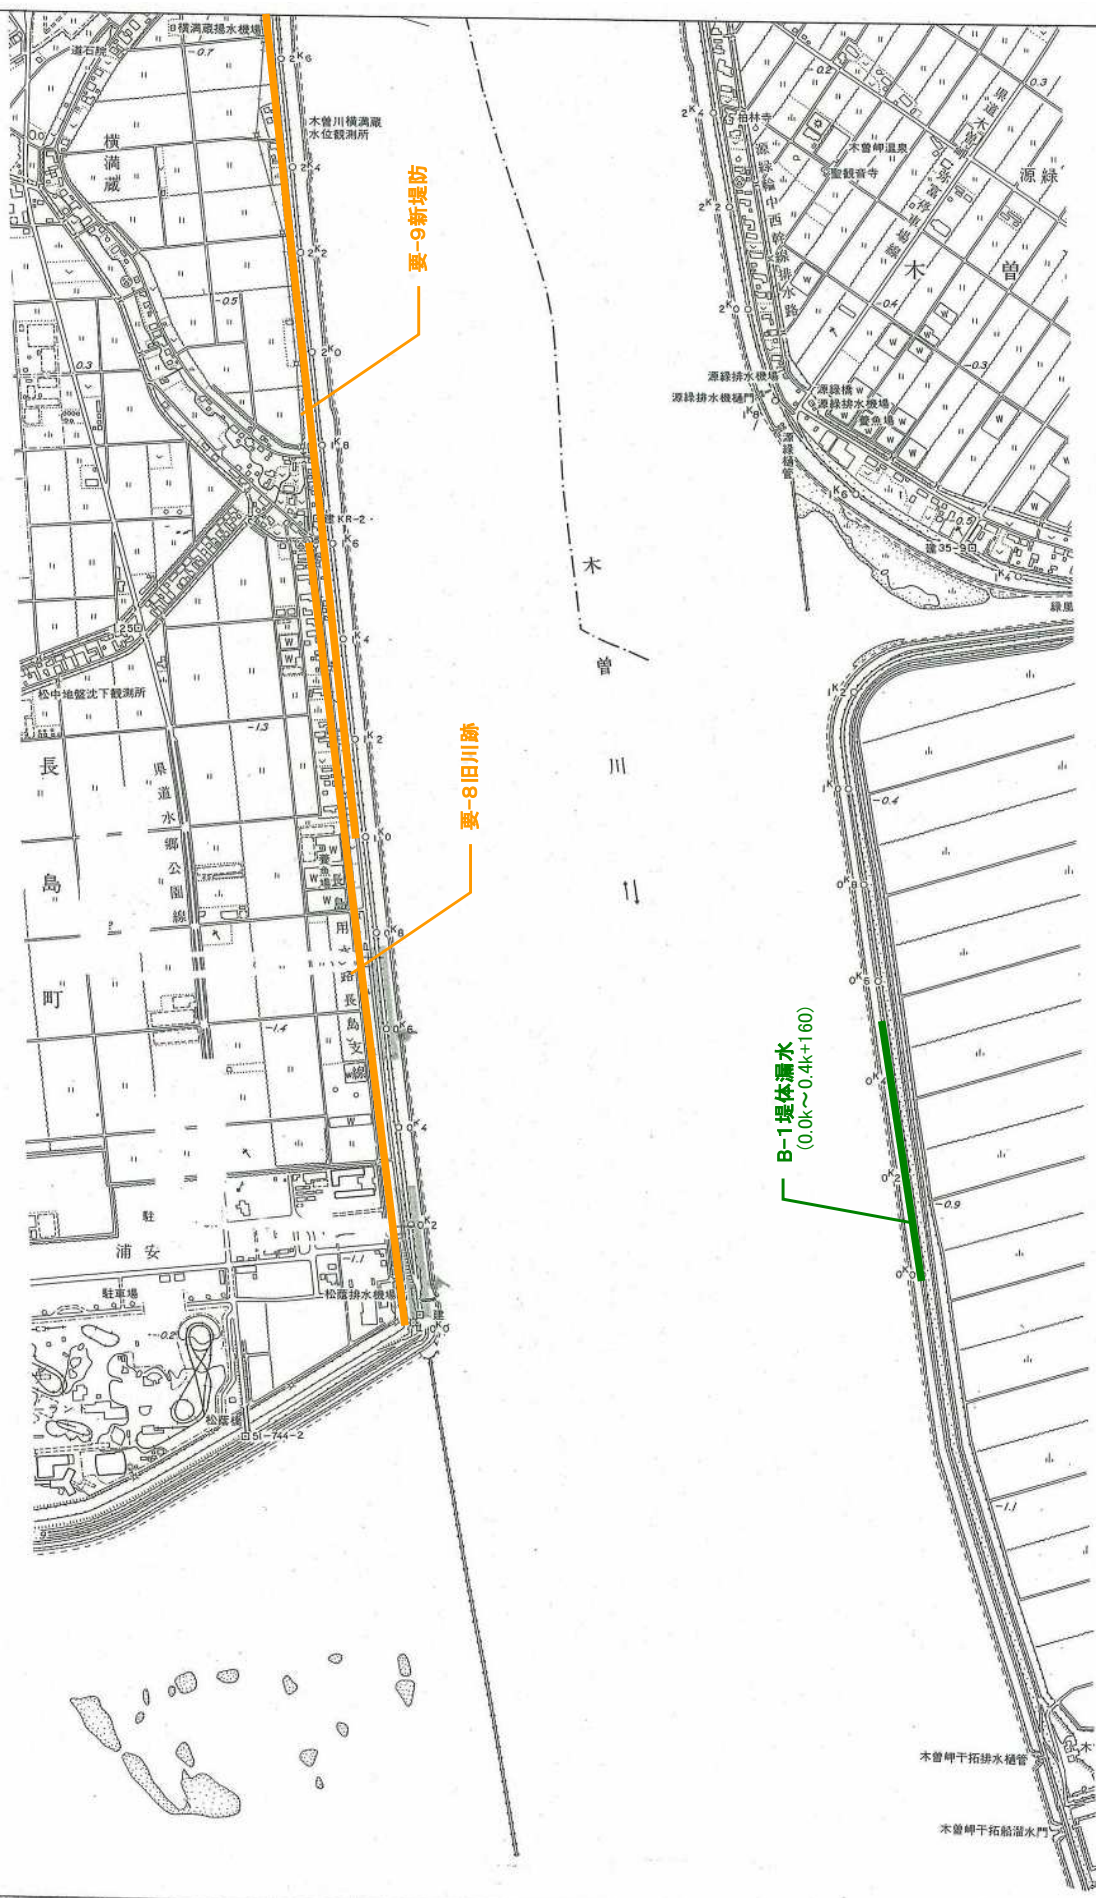


凡例	
重点区間	■
重要度A	■
重要度B	■
要注意箇所	■
堤防詳細点検(重要度B)	■



1 : 10,000


令和7年3月作成

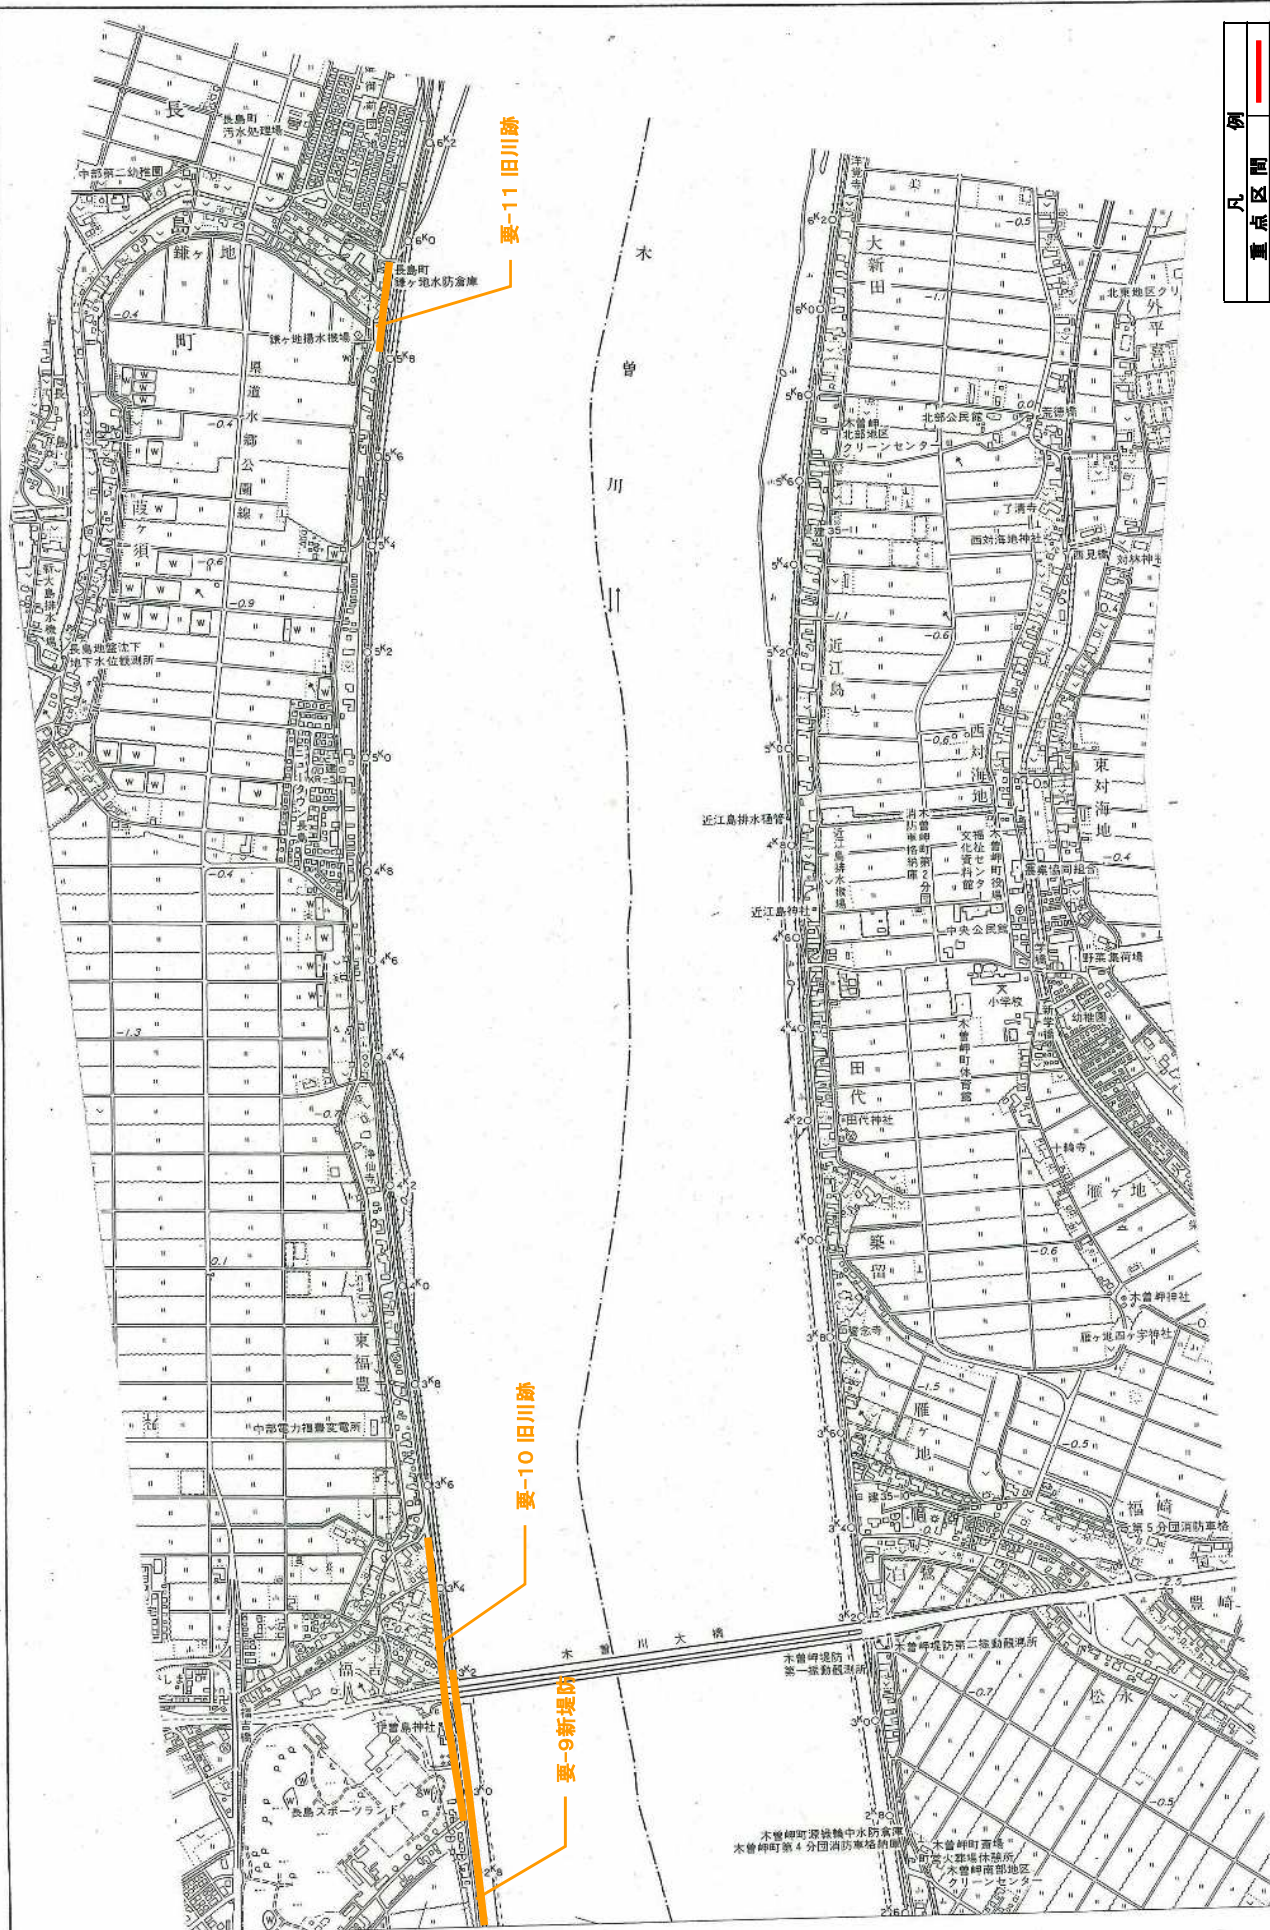

例	凡
重点区	
重要度 A	
重要度 B	
要注意箇所	
提防詳細点候(重要度B)	


1 : 10,000

令和7年3月作成

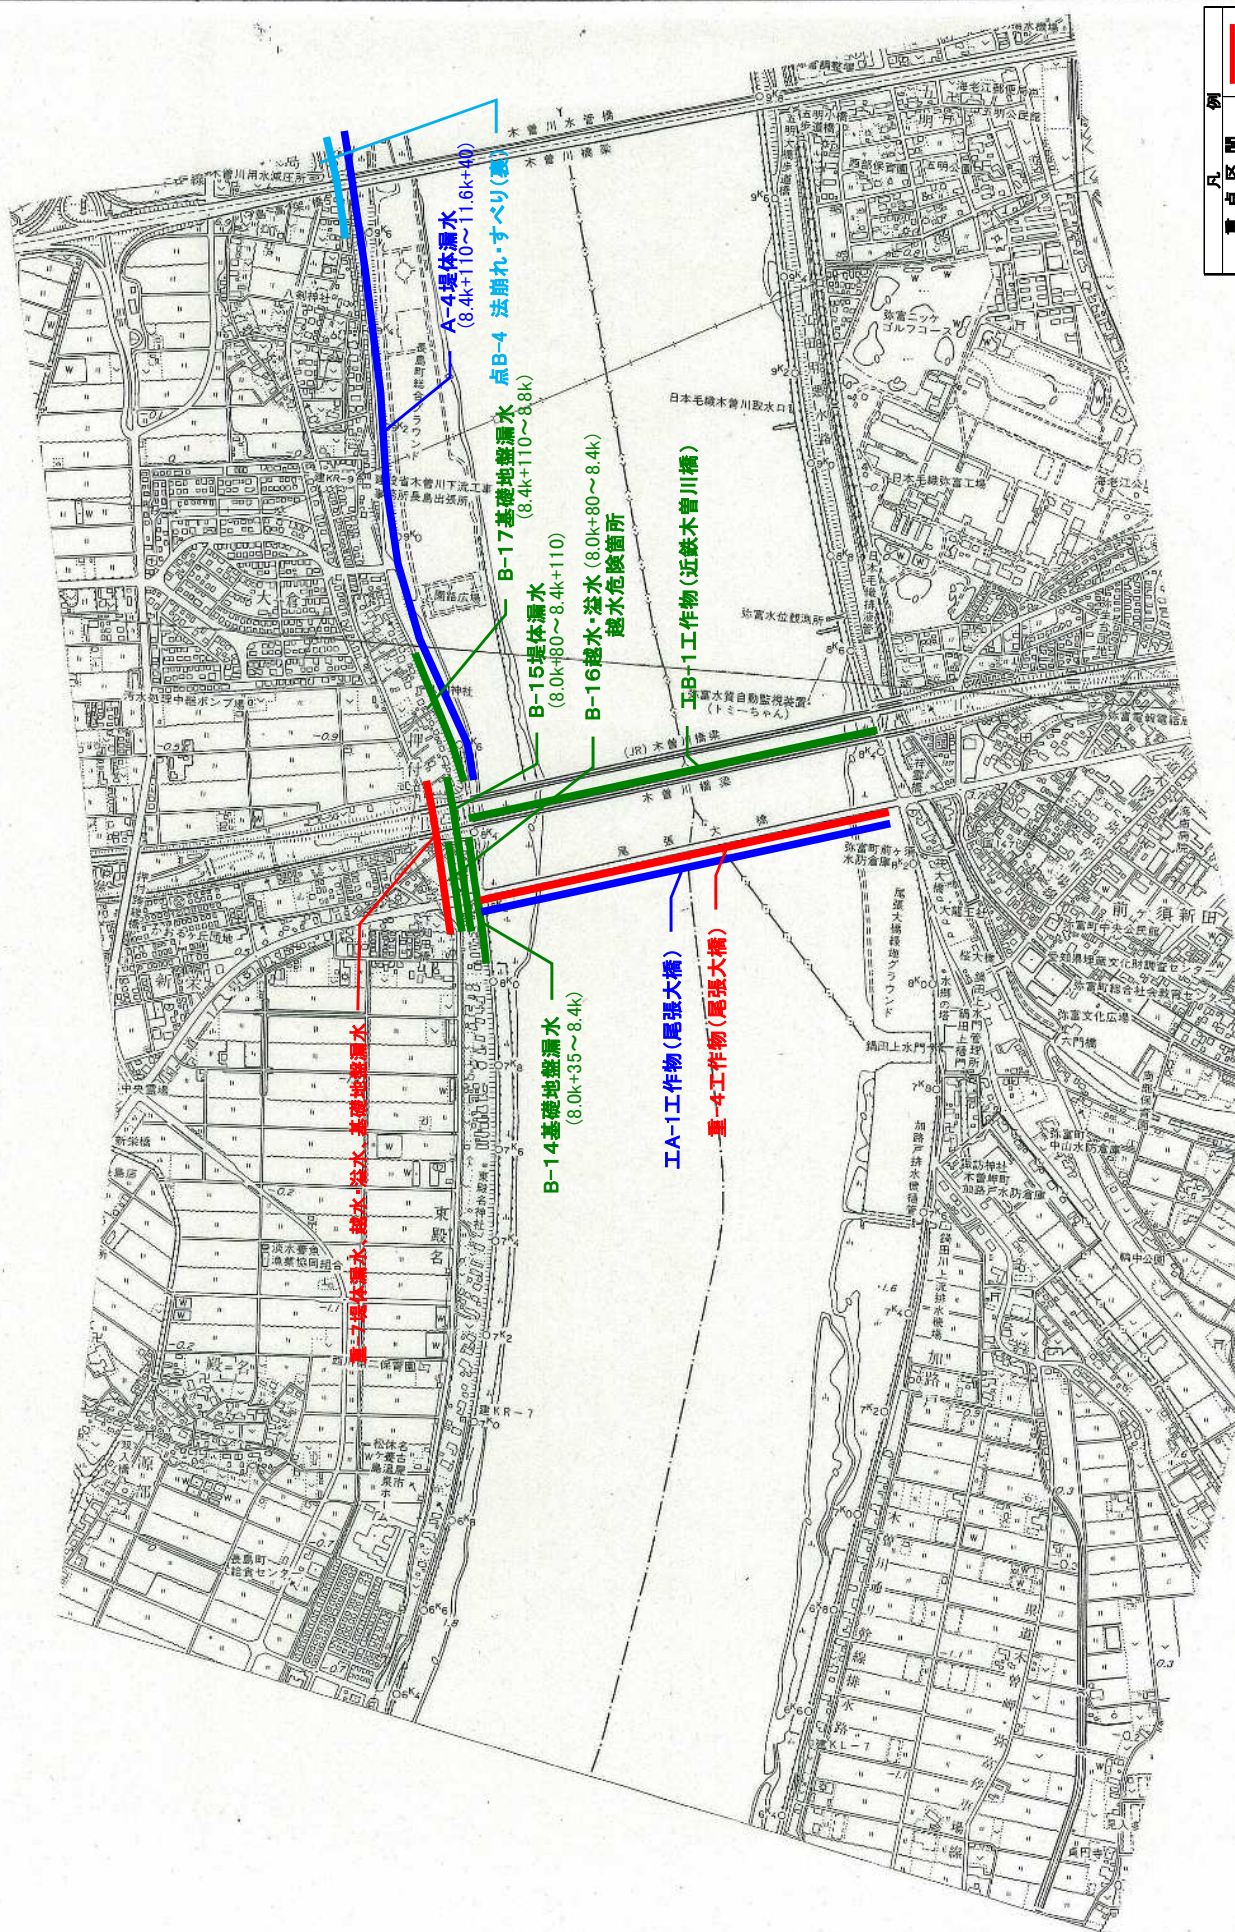


凡例
重点区間
重要度A
重要度B
重要箇所
堤防修繕点線(重要度B)

1 : 10,000



令和7年3月作成

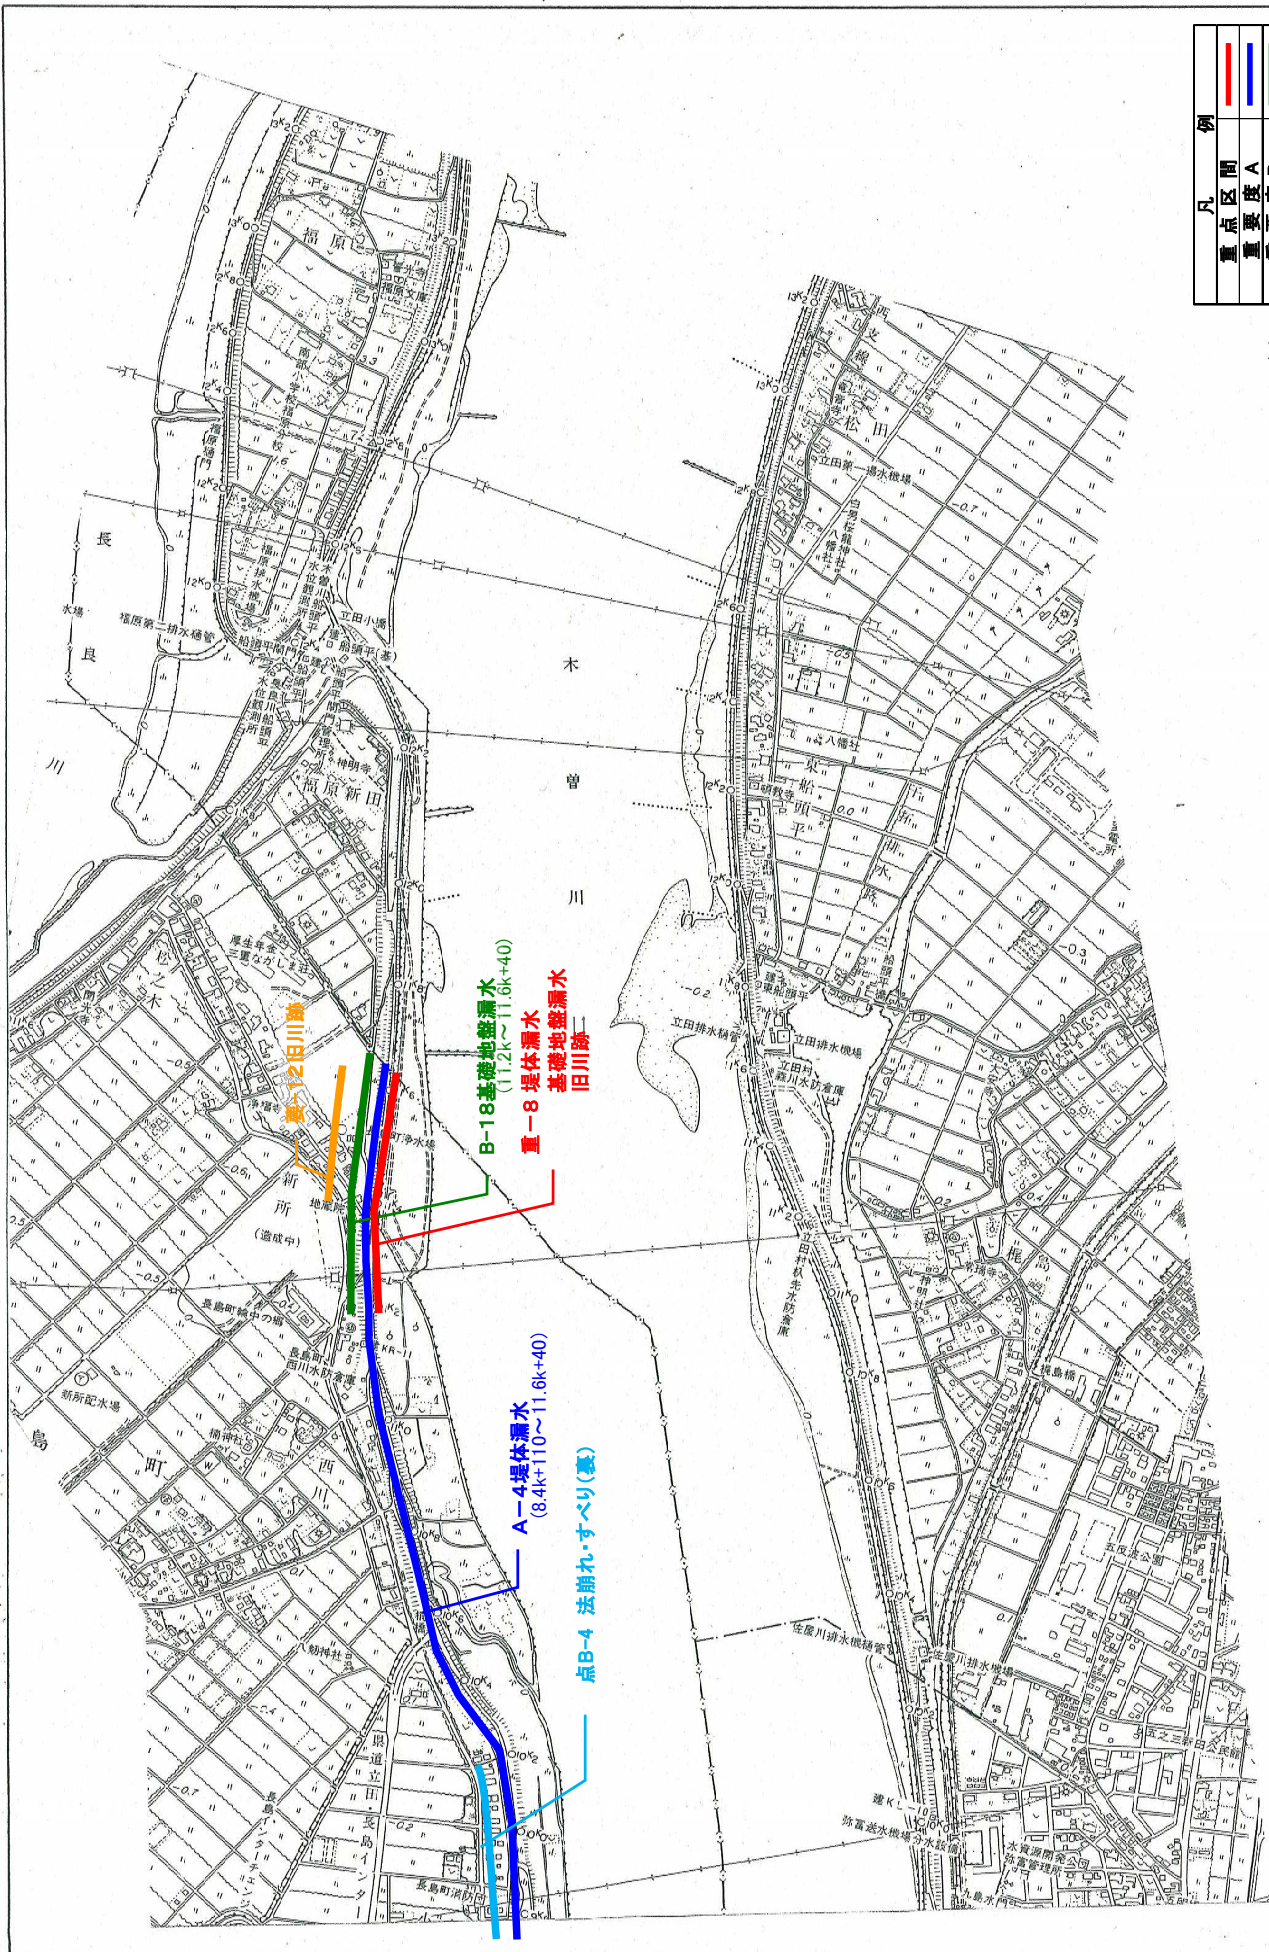

凡 例
重点区間
重要度A
重要度B
要注意箇所
堤防詳細図表(重要度B)

1 : 10,000

令和7年3月作成

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
1	長良川	基礎地盤漏水	左	3.6k から 4.2k	桑名市長島町福豊 桑名市長島町赤地	720	要1
2	長良川	堤体漏水 越水・溢水	左	5.6k+153 から 5.8k+56	桑名市長島町十日外面	100	B1、B2
3	長良川	工作物	左 右	5.8K+ 39.7 5.8K+ 59.8	桑名市長島町十日外面 桑名市福島	—	工A-1 伊勢大橋

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	長良川	堤 体 漏 水	左	7.0k から 7.6K	桑名市長島町西外面	810	堤防の脆弱性 すべり破壊
2	長良川	堤 体 漏 水	左	10.4k から 11.8k	桑名市長島町上坂手 桑名市長島町松之木	1,672	すべり破壊
4	長良川	越 水 ・ 溢 水	右	5.8k から 6.6K	桑名市福島 桑名市上之輪	836	暫定堤防（中堤） 河積不足 （積土のう工）
5	長良川	越 水 ・ 溢 水	右	7.0K から 7.6K	桑名市上之輪	672	暫定堤防（中堤） 河積不足 （積土のう工）
6	長良川	越 水 ・ 溢 水	右	8.8K から 9.4K	桑名市長島町千倉	603	暫定堤防（中堤） 河積不足 （積土のう工）
7	長良川	越 水 ・ 溢 水	右	10.8K から 11.2K	桑名市長島町上坂手	377	暫定堤防（中堤） 河積不足 （積土のう工）

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	長良川	堤体漏水	左	5.6K+153 から 5.8K+56	桑名市長島町十日外面	100	断面不足
2	長良川	越水・溢水	左	5.6k+153 から 5.8K+56	桑名市長島町十日外面	100	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
3	長良川	基礎地盤漏水	左	7.0k から 7.6K	桑名市長島町西外面	810	パイピング破壊
4	長良川	越水・溢水	左	7.2k から 7.4k	桑名市長島町西外面	253	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
5	長良川	堤体漏水	左	7.6k から 7.8k	桑名市長島町西外面	186	被災履歴・点検結果
6	長良川	越水・溢水	左	7.6K から 11.8k	桑名市長島町西外面 桑名市長島町松之木	3,724	河積不足 (積土のう工)
7	長良川	堤体漏水	左	9.4k から 10.4k	桑名市長島町下坂手	701	被災履歴・点検結果
8	長良川	基礎地盤漏水	左	9.4k から 10.4k	桑名市長島町下坂手	701	パイピング破壊

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
14	長良川	堤体漏水	右	5.2k から 12.4K+98	桑名市福島 桑名市長島町松之木	7,510	断面不足 (中堤)
15	長良川	越水・溢水	右	5.6K から 5.8K	桑名市福島	226	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
16	長良川	越水・溢水	右	6.6K から 7.0K	桑名市上之輪	416	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
17	長良川	越水・溢水	右	7.6K から 8.0K	桑名市長島町千倉	416	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
18	長良川	越水・溢水	右	9.4K から 10.8K	桑名市長島町千倉	1,257	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
19	長良川	越水・溢水	右	11.2K から 12.4K	桑名市長島町松之木	1,495	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
20	長良川	越水・溢水	右	12.4K から 12.4K+98	桑名市長島町松之木	98	暫定堤防 (中堤) 河積不足 (積土のう工)

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	長良川	工 作 物	左 右	5.8K+ 39.7 5.8K+ 59.8	桑名市長島町十日外面 桑名市福島	—	桁下不足 伊勢大橋

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞


(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	長良川	工 作 物	左 右	2.4K+140 2.4K+175	桑名市長島町福吉 桑名市大字地藏	—	桁下不足 名四国道揖斐長良大橋
2	長良川	工 作 物	左 右	2.4K+160 2.4K+195	桑名市長島町福吉 桑名市大字地藏	—	桁下不足 名四国道揖斐長良大橋
3	長良川	工 作 物	左 右	7.0K+179.8 7.0K+131	桑名市長島町西外面 桑名市上之輪新田	—	桁下不足 近鉄揖斐長良川橋
4	長良川	工 作 物	左 右	7.8K+120 7.8K+170	 桑名市長島町千倉	—	桁下不足 東名阪揖斐長良川橋

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞


図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	長良川	基礎地盤漏水	左	3.6k から 4.2k	桑名市長島町福豊 桑名市長島町赤地	720	旧川・破堤跡以外 履歴有（対策済） （月の輪工）
2	長良川	旧 川 跡	左	11.6k+400 から 11.8k-50	桑名市長島町松之木	180	三川分流工事で締切

長良川 2. 2k ~ 5. 4k

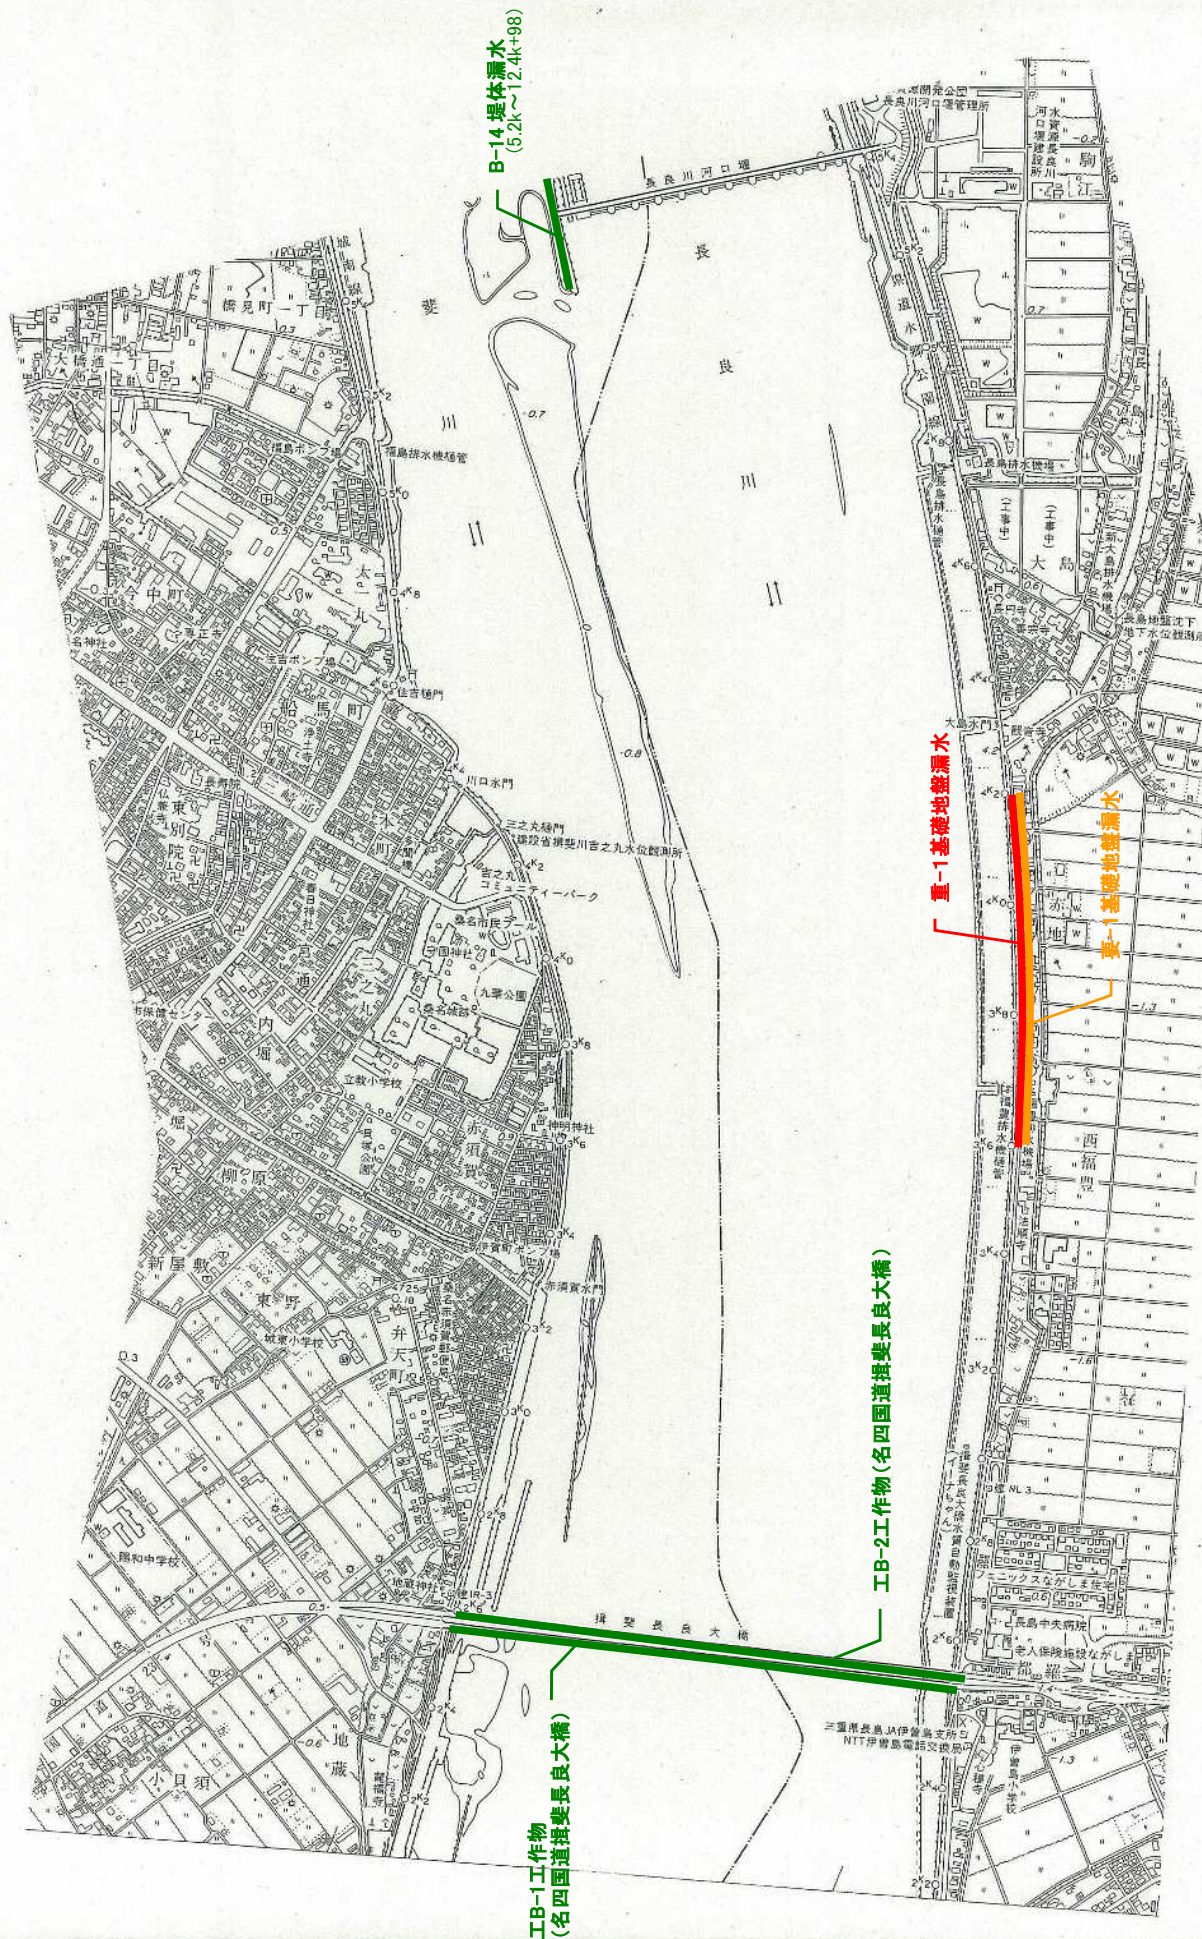

凡例
重点区間
重要度A
重要度B
要注箇所
堤防詳細品線(重要度B)

1 : 10,000




令和7年3月作成

2400




長良川 9. 6k ~ 13. 6k

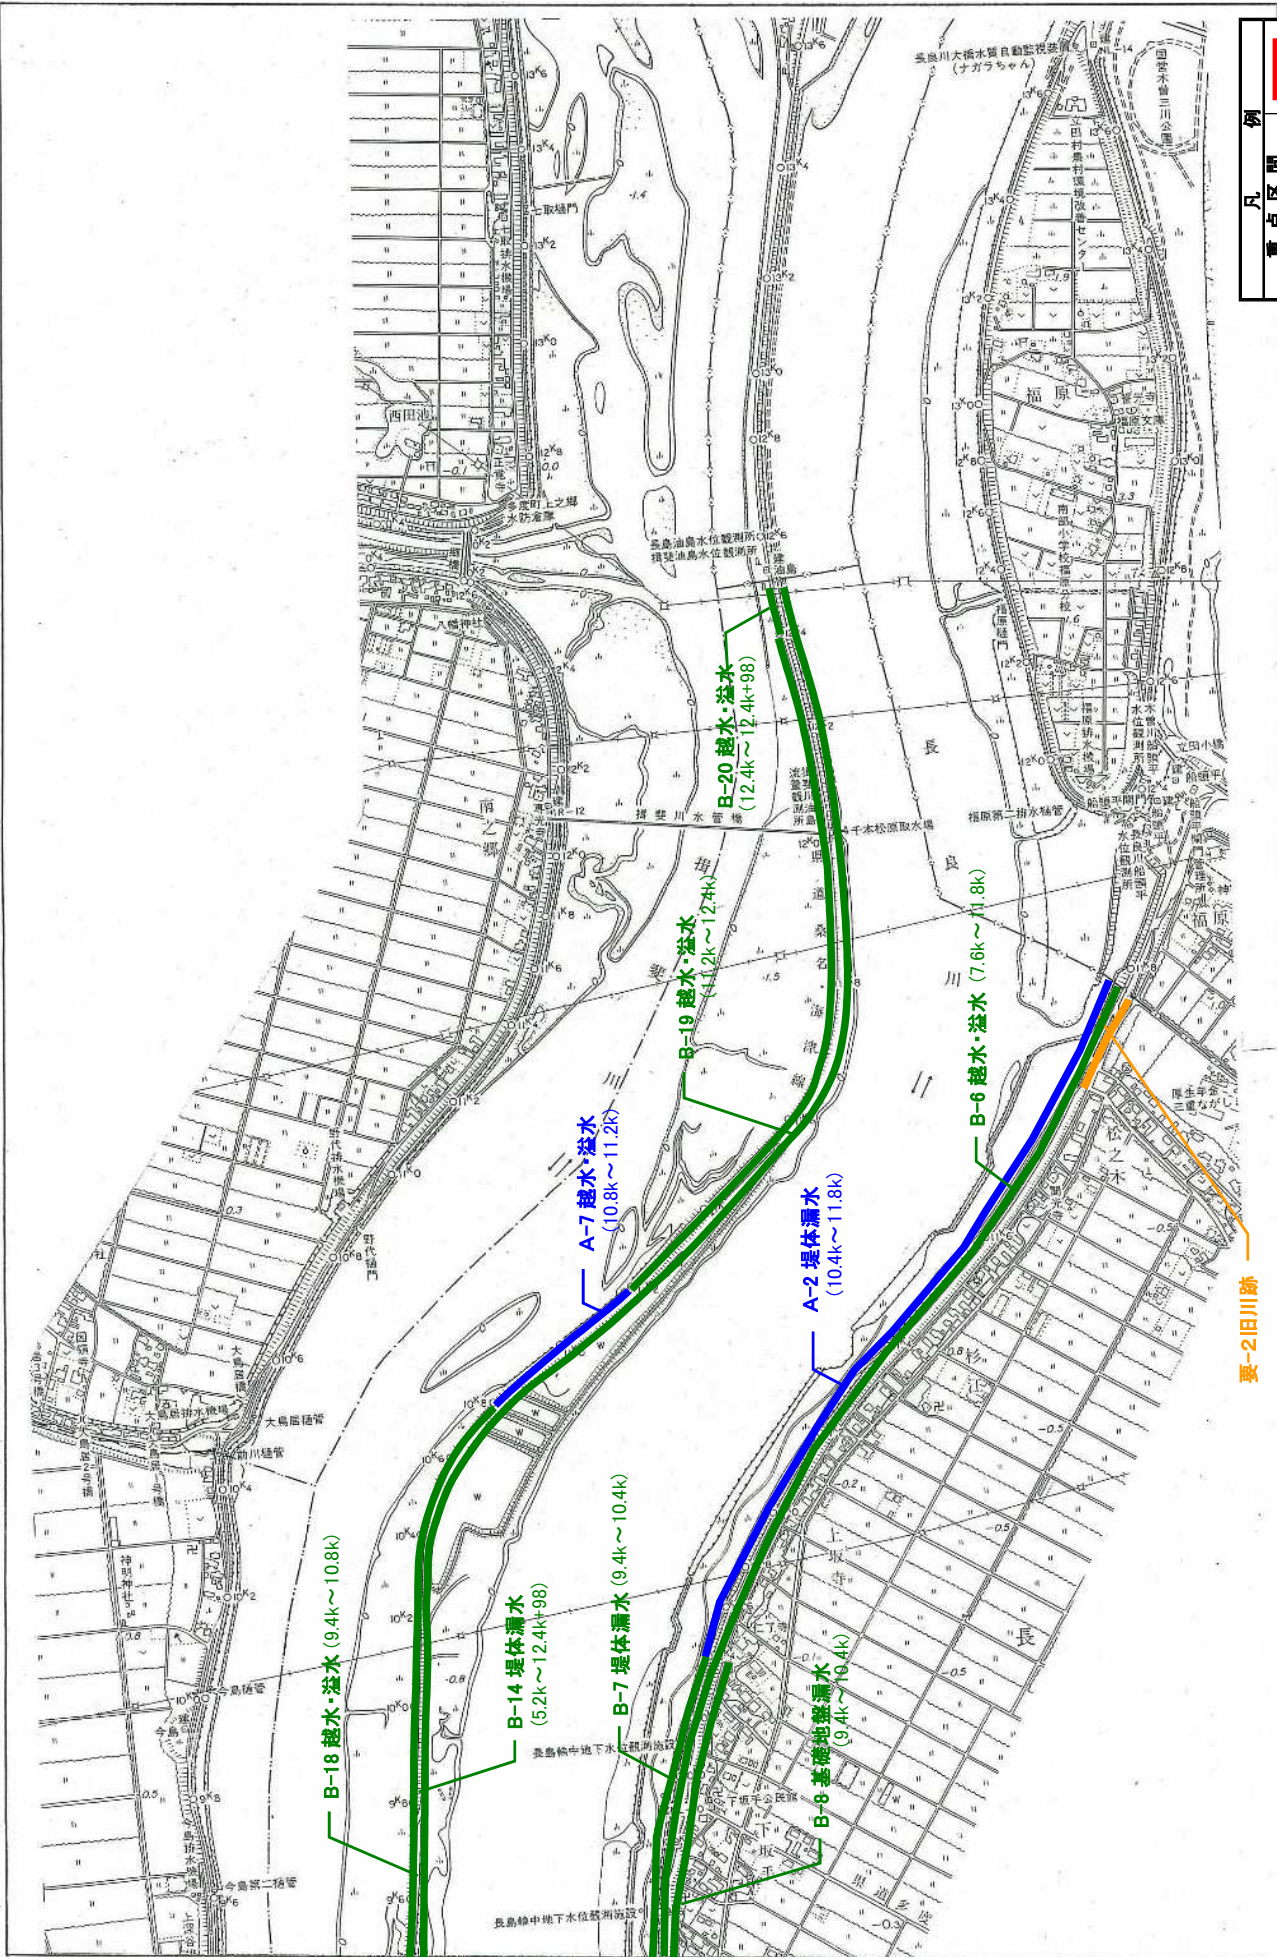

凡 例
重点区間
重要度 A
重要度 B
要注意箇所
堤防詳細点検(重要度B)

要-2旧川跡

1 : 10,000



令和7年3月作成

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
1	揖斐川	旧 川 跡 新 堤 防 基礎地盤漏水	左	0.0K+150 から 0.4K+ 50	桑名市長島町松蔭	300	要1、要2、要3
2	揖斐川	工 作 物	左 右	5.8K+ 40 5.8K+ 59.8	桑名市福島	—	工A-1 伊勢大橋
7	揖斐川	堤 体 漏 水 基礎地盤漏水 越 水 ・ 溢 水	右	6.6k から 7.8K+220	桑名市上之輪新田 桑名市下深谷部	1,385	A9, A10, B26, B27, B28, B29, 要15
8	揖斐川	堤 体 漏 水 基礎地盤漏水	右	11.4K から 11.6K	桑名市多度町南之郷	148	A10, B32
9	揖斐川	堤 体 漏 水 越 水 ・ 溢 水	右	11.8K から 12.0K	桑名市多度町南之郷	123	A10, B33
11	揖斐川 (肱江川)	堤 体 漏 水 越 水 ・ 溢 水 基礎地盤漏水 新 堤 防	右	0.8k から 1.6k	桑名市多度町中須	807	A18, B46, 要19, 要20

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	5.8k から 6.6k	桑名市福島 桑名市長島町西外面	727	河積不足
2	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	7.0k から 7.6k	桑名市長島町西外面 桑名市長島町千倉	672	河積不足
9	揖斐川	堤 体 漏 水	右	6.6k から 7.6k	桑名市上之輪新田 桑名市東汰上	975	堤防の脆弱性 すべり破壊
10	揖斐川	堤 体 漏 水	右	7.8k から 16.6k+50	桑名市東汰上 桑名市多度町東平賀	8,684	堤防の脆弱性 すべり破壊
17	揖斐川 (肱江川)	堤 体 漏 水	左	0.8k から 2.0k	桑名市多度町上之郷 桑名市多度町肱江	1,247	堤防の脆弱性 すべり破壊
18	揖斐川 (肱江川)	堤 体 漏 水	右	0.0k から 2.0k	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町下野代	1,862	堤防の脆弱性 すべり破壊
19	揖斐川 (多度川)	堤 体 漏 水	左	0.0k から 1.8k	桑名市多度町上之郷 桑名市多度町香取	1,637	すべり破壊
20	揖斐川 (多度川)	堤 体 漏 水	右	0.8k から 1.0k	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町下野代	300	堤防の脆弱性

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	揖斐川	堤 体 漏 水	左	2. 4K+201 から 2. 4K+238	桑名市長島町福吉	40	断面不足
2	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	2. 4K+201 から 2. 4K+238	桑名市長島町福吉	40	河積不足 (積土のう工)
3	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	5. 6k から 5. 8k	桑名市福島	199	河積不足 (積土のう工)
4	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	6. 6k から 7. 0k	桑名市長島町千倉 桑名市長島町西外面	416	河積不足 (積土のう工)
5	揖斐川	水 衝 ・ 洗 掘	左	7. 2k-107 から 7. 2k-59	桑名市長島町西外面	48	暫定施工
6	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	7. 6k から 8. 0k	桑名市長島町千倉	416	河積不足 (積土のう工)
7	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	8. 8k から 11. 8k	桑名市福島 桑名市長島町松之木	3, 007	河積不足 (積土のう工)
8	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	左	12. 0k から 12. 4k+100	桑名市長島町松之木	538	河積不足 (積土のう工)

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
20	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	0.0k から 0.2k	桑名市福岡町	201	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
21	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	2.4K+ 160 から 2.6k	桑名市地蔵 桑名市赤須賀	40	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
22	揖斐川	堤 体 漏 水	右	2.4K+ 160 から 2.6k	桑名市地蔵 桑名市赤須賀	40	断面不足
23	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	5.8k+5 から 5.8K+103	桑名市福島	100	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
24	揖斐川	堤 体 漏 水	右	5.8k+45 から 5.8K+80	桑名市福島	40	断面不足
25	揖斐川	基礎地盤漏水	右	6.2K+150 から 6.4K+ 30	桑名市上之輪新田	80	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
26	揖斐川	基礎地盤漏水	右	6.6k から 8.0k	桑名市上之輪新田 桑名市下深谷部	1,395	パイピング破壊
27	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	6.8k から 7.2k	桑名市上之輪新田	431	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)
28	揖斐川	堤 体 漏 水	右	7.6k から 7.8k	桑名市東汰上	190	すべり破壊

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
29	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	7. 8K+190 から	桑名市下深谷部	30	暫定堤防 河積不足
30	揖斐川	基礎地盤漏水	右	10. 2k から 10. 4k	桑名市今島	224	被災履歴・点検結果
31	揖斐川	基礎地盤漏水	右	10. 6k から 11. 2K	桑名市今島 桑名市多度町南之郷	657	被災履歴・点検結果
32	揖斐川	基礎地盤漏水	右	11. 4k から 11. 6K	桑名市多度町南之郷	148	被災履歴・点検結果
33	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	11. 8k から 12. 0k	桑名市多度町南之郷	123	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
34	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	12. 8k から 13. 0k	桑名市多度町南之郷	231	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
35	揖斐川	越 水 ・ 溢 水	右	14. 2k から 16. 2k	桑名市多度町福永 桑名市多度町平古	1, 924	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
45	揖斐川 (肱江川)	越 水 ・ 溢 水	左	0.8K から 2.0k	桑名市多度町香取 桑名市多度町肱江	1,247	越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)
46	揖斐川 (肱江川)	越 水 ・ 溢 水	右	0.8K から 1.6k	桑名市多度町中須 桑名市多度町下野代	798	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)
47	揖斐川 (多度川)	越 水 ・ 溢 水	左	1.6K から 2.0K	桑名市多度町香取	240	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
48	揖斐川 (多度川)	堤 体 漏 水	左	1.8k から 2.0K	桑名市多度町香取	240	断面不足
49	揖斐川 (多度川)	堤 体 漏 水	右	1.0K から 1.2K	桑名市多度町香取	255	被災履歴・点検結果
50	揖斐川 (多度川)	堤 体 漏 水	右	1.6K から 2.0k	桑名市多度町香取	432	被災履歴・点検結果
51	揖斐川 (多度川)	越 水 ・ 溢 水	右	1.4k から 1.6k	桑名市多度町香取	215	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
52	揖斐川 (多度川)	越 水 ・ 溢 水	右	1.8k から 2.0k	桑名市多度町香取	201	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	揖斐川	工 作 物	左 右	5.8K+ 40 5.8K+ 59.8	桑名市福島	—	桁下不足 伊勢大橋

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	揖斐川	工 作 物	左 右	2.6K- 94.1 2.6K- 30.8	桑名市長島町福吉 桑名市地蔵	—	桁下不足 名四揖斐長良川大橋(下流)
2	揖斐川	工 作 物	左 右	2.6K- 73.2 2.6K- 9.8	桑名市長島町福吉 桑名市地蔵	—	桁下不足 名四揖斐長良川大橋(上流)
3	揖斐川	工 作 物	左 右	7.0K+131 7.0K+ 80.5	桑名市上之輪新田	—	桁下不足 近鉄揖斐長良川橋
4	揖斐川	工 作 物	左 右	7.8K+175 8.0k	桑名市上之輪新田	—	桁下不足 東名阪揖斐長良川橋
5	揖斐川	工 作 物	左 右	7.8K+175 8.0k	桑名市上之輪新田	—	桁下不足 東名阪揖斐長良川水管橋
8	揖斐川 (多度川)	工 作 物	左 右	0.2K+ 19 0.2K+ 19	桑名市多度町香取	—	桁下不足 二郷橋
9	揖斐川 (多度川)	工 作 物	左 右	1.8K+ 55.3 1.8K+ 9.5	桑名市多度町香取	—	桁下不足 香取橋
10	揖斐川 (多度川)	工 作 物	左 右	1.8K+207.5 2.0K+ 15.8	桑名市多度町香取	—	桁下不足 新多度橋

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	揖斐川	旧 川 跡	左	-1.0k から 2.0k	桑名市長島町浦安 桑名市長島町福吉	3,050	三川分流工事で干拓
2	揖斐川	新 堤 防	左	0.0k+150 から 1.6k+105	桑名市長島町松蔭 桑名市長島町白鷄	1,625	R4揖斐川白鷄高潮堤防嵩 上工事 R6.3完成
3	揖斐川	基礎地盤漏水	左	0.0K+150 から 0.4K+ 50	桑名市長島町松蔭	300	旧川・破堤跡以外 履歴有（対策済） （月の輪工）
4	揖斐川	新 堤 防	左	1.6k+132 から 3.4k+3	桑名市長島町白鷄 桑名市長島町福豊	1,765	R4揖斐川福吉高潮堤防嵩 上工事 R6.3完成
12	揖斐川	旧 川 跡	右	-0.6k から 1.8k+115	桑名市福岡町 桑名市立田町	2,650	城南干拓事業 S21～S32
13	揖斐川	新 堤 防	右	0.6k+115 から 2.4k+130	桑名市立田町 桑名市地藏	1,822	R4揖斐川立田高潮堤防嵩上工事 R6.3完成
14	揖斐川	陸 閘	右	3.2k+60	桑名市赤須賀		赤須賀（横引） H21.12改築
15	揖斐川	基礎地盤漏水	右	7.2K から 11.4K+ 160	桑名市上之輪新田 桑名市多度町南之郷	4,300	地元要望有り
16	揖斐川	工 事 施 工	右	9.2k+40.8 から 9.4k+80.1	桑名市今島町江向	238	R3揖斐川御砂樋管改築工事 R3.11～R8.3 工事施工
17	揖斐川	旧 川 跡	右	16.4k+100 から 16.6k+80	桑名市多度町東平賀	180	三川分流工事で締切


令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
18	揖斐川 (肱江川)	基礎地盤漏水	左	1.4K から 2.0K	桑名市多度町香取 桑名市多度町肱江	600	出張所の現場確認により
19	揖斐川 (肱江川)	基礎地盤漏水	右	0.0K から 2.1K	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町下野代	1,950	出張所の現場確認により
20	揖斐川 (肱江川)	新 堤 防	右	1.2k+51 から 1.4k+56.1	桑名市多度町中須	189	R3肱江川堤防整備工事 R6.3完成
21	揖斐川 (多度川)	旧 川 跡	左	1.8k-25 から 1.8k+50	桑名市多度町香取 桑名市多度町香取	80	三川分流工事で締切

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞


(重要度B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重 複 番 号)
9	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	6. 8k ～ 7. 6k+57	桑名市大字上之輪新田 桑名市下深谷部	950	
10	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	7. 8k+150 ～ 8. 2k	桑名市下深谷部 桑名市下深谷部	250	
11	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	10. 4k ～ 11. 0k+150	桑名市大字今島 桑名市多度町南之郷	850	
12	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	11. 2k+50 ～ 11. 4k+100	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町南之郷	250	
13	揖斐川	法崩れ・すべり (裏)	右	11. 6k ～ 16. 2k	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町平古	4, 390	
16	揖斐川 (肱江川)	法崩れ・すべり (裏)	左	1. 0k ～ 2. 0k	桑名市多度町香取 桑名市多度町肱江	980	
17	揖斐川 (肱江川)	法崩れ・すべり (裏)	右	0. 2k ～ 1. 4k+50	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町中須	1, 270	
18	揖斐川 (多度川)	法崩れ・すべり (裏)	左	0. 0k ～ 2. 0k	桑名市多度町上之郷 桑名市多度町香取	1, 850	

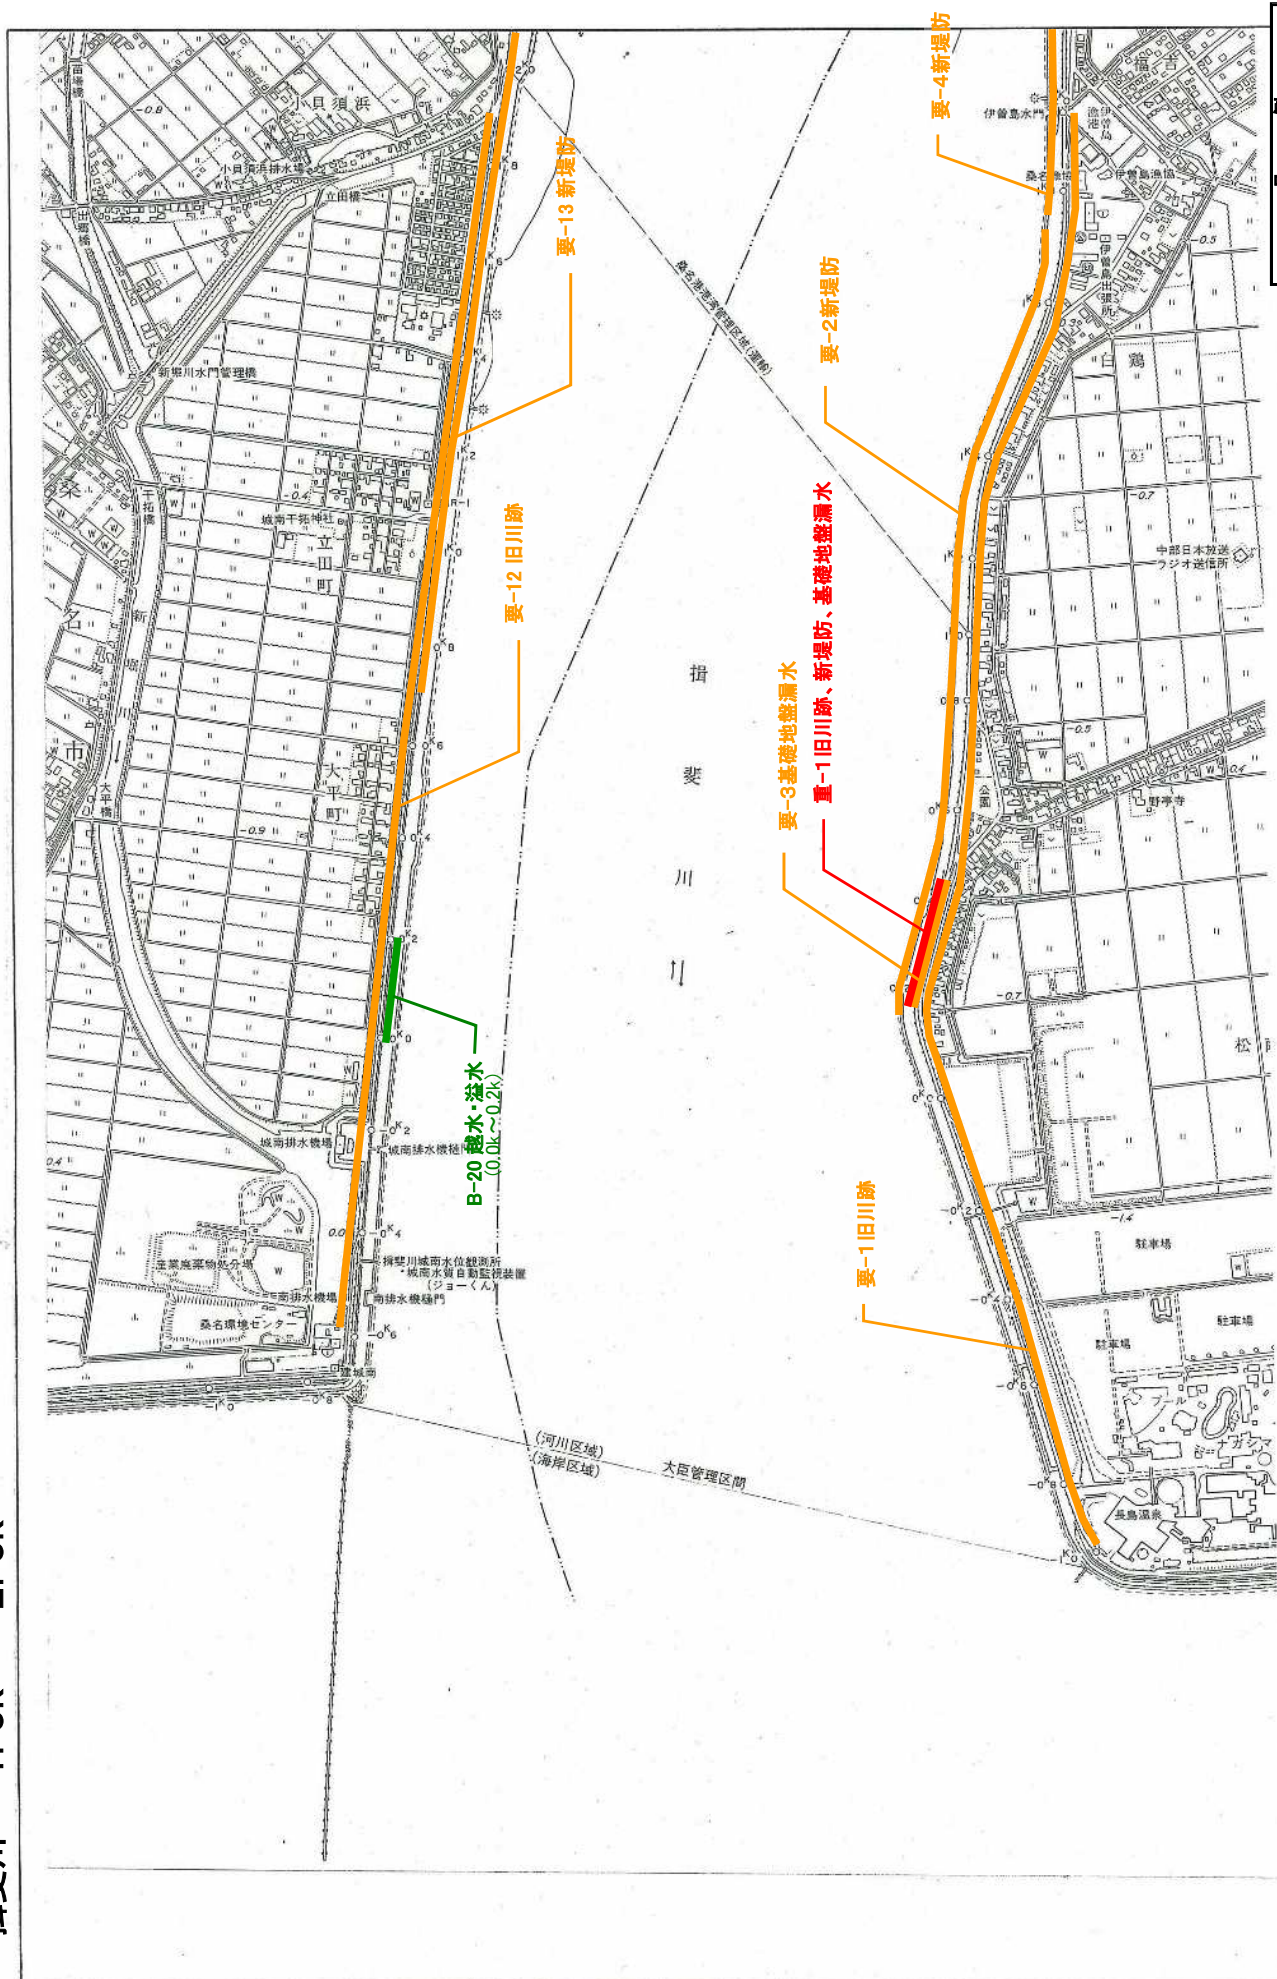


凡 例
重点区間
重要度A
重要度B
要注意箇所
堤防詳細点検(重要度B)

1 : 10,000




令和7年3月作成

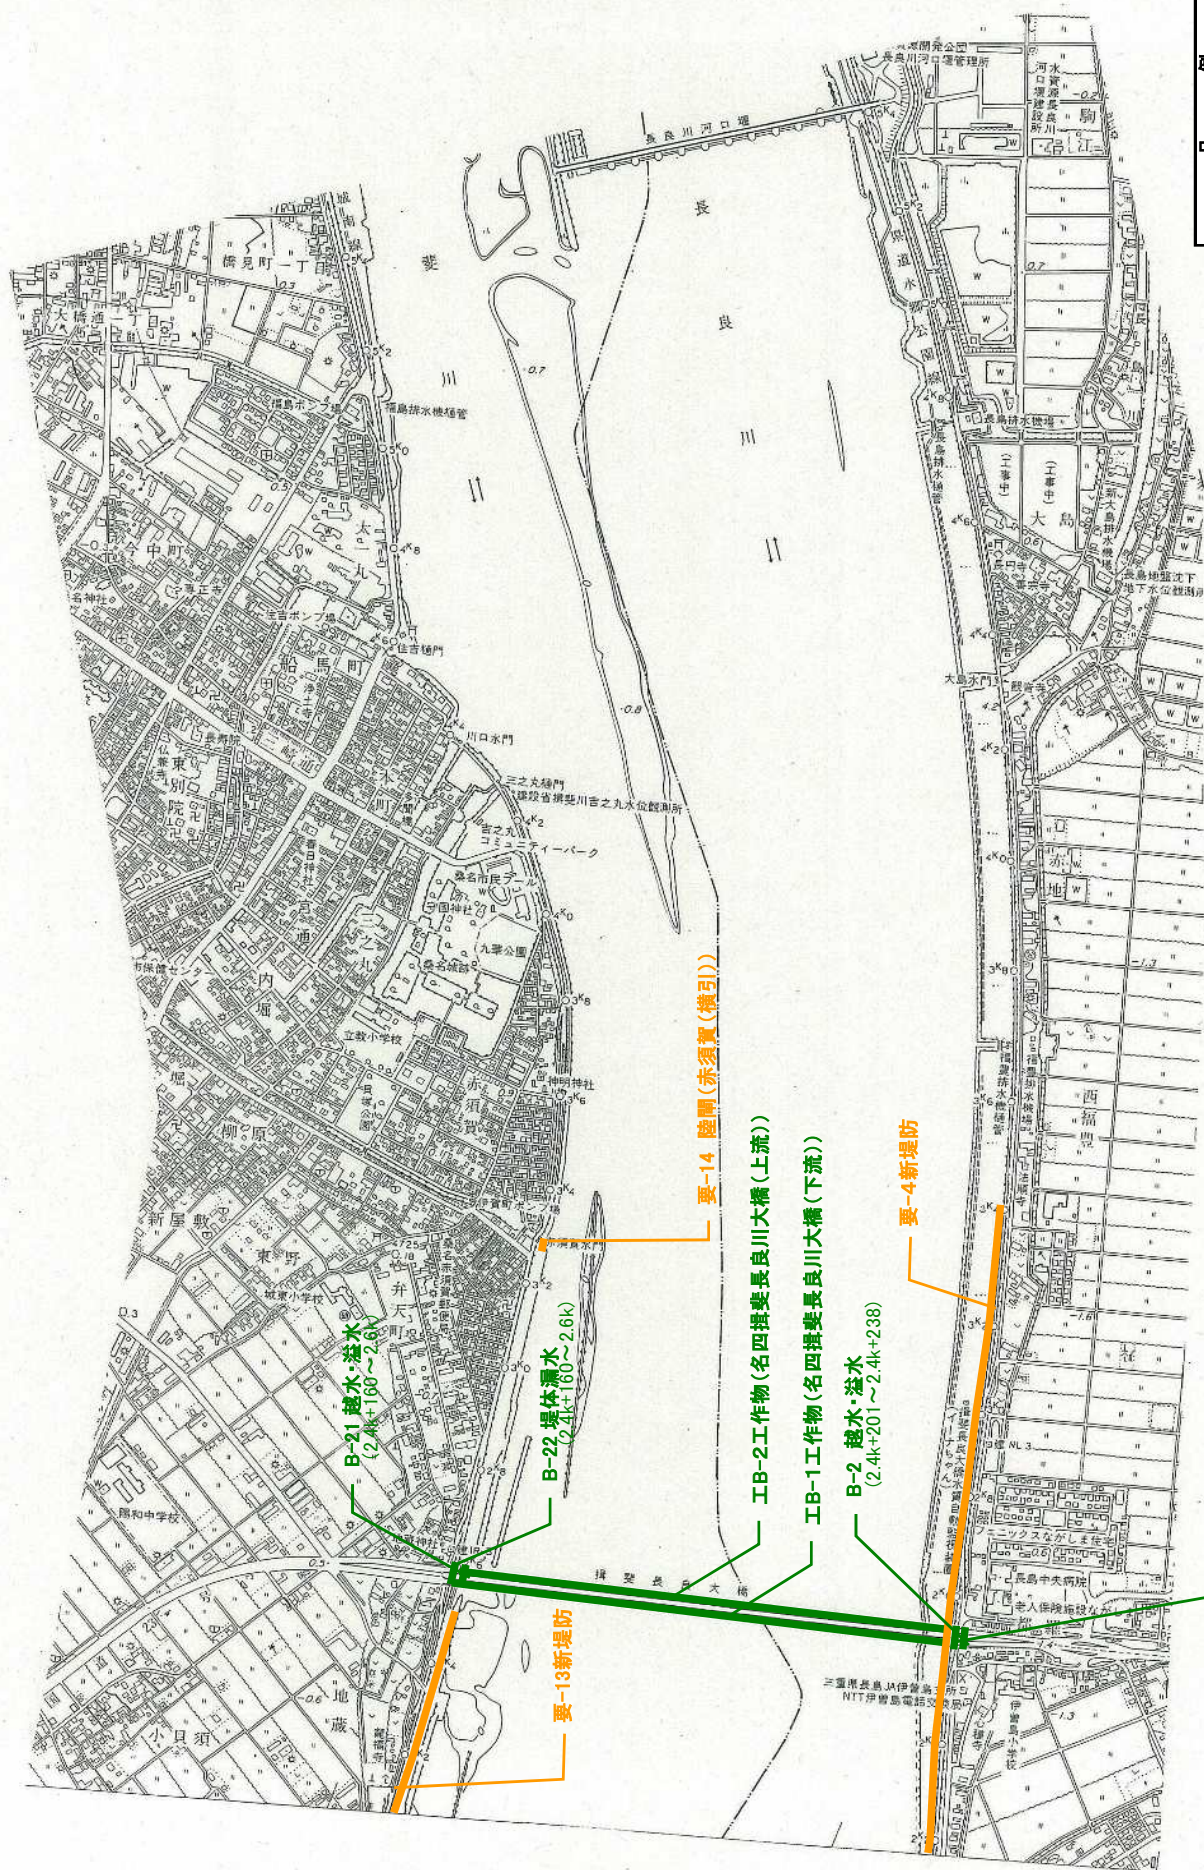

凡 例
重点区間
重要度 A
重要度 B
要注意箇所
堤防詳細品級(重要度B)


1 : 10,000


令和7年3月作成

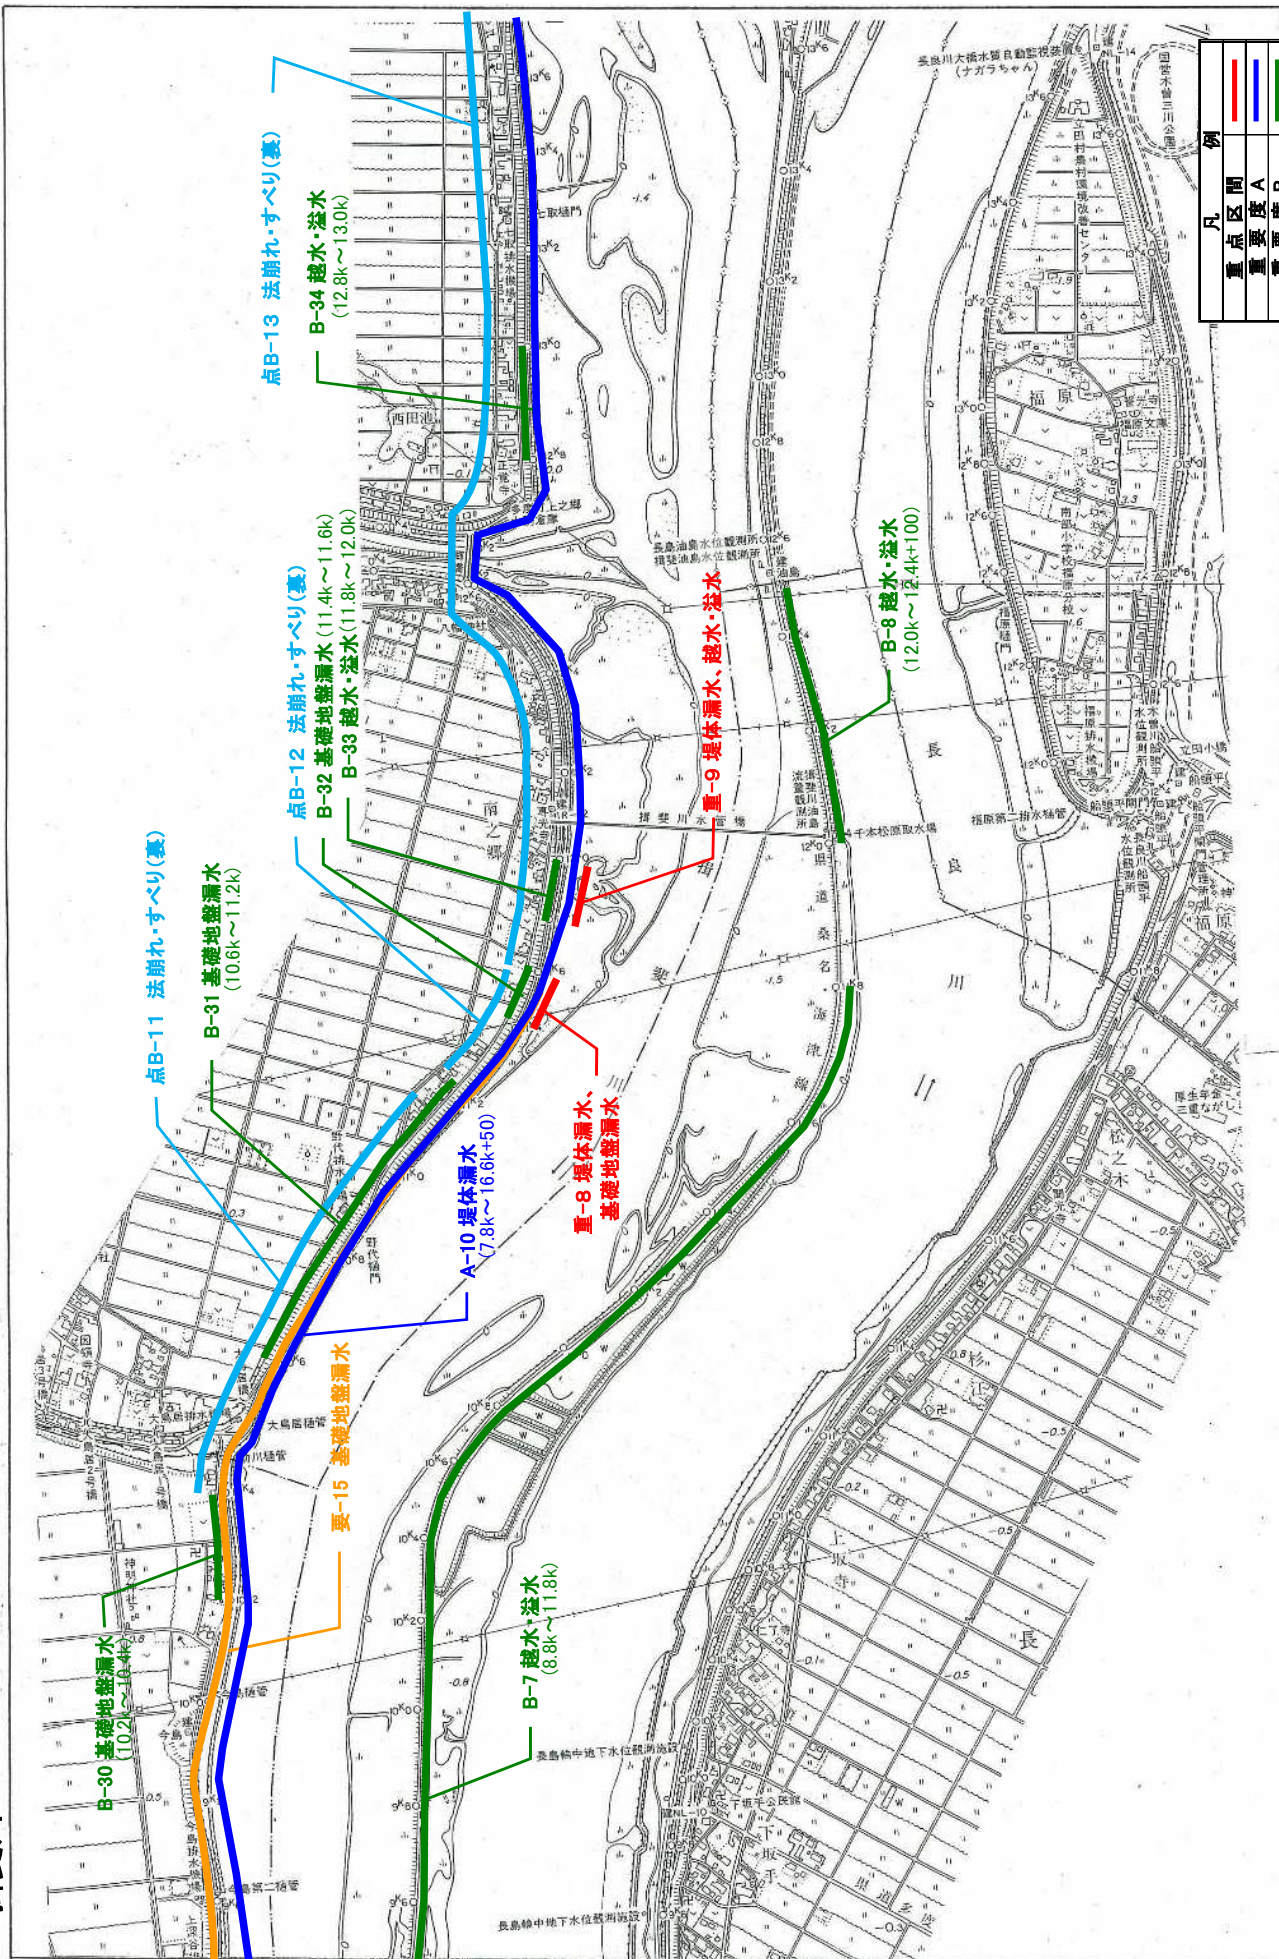

凡 例
重点区間
重要度 A
重要度 B
要注箇所
堤防詳細点検(重要度B)


1 : 10,000



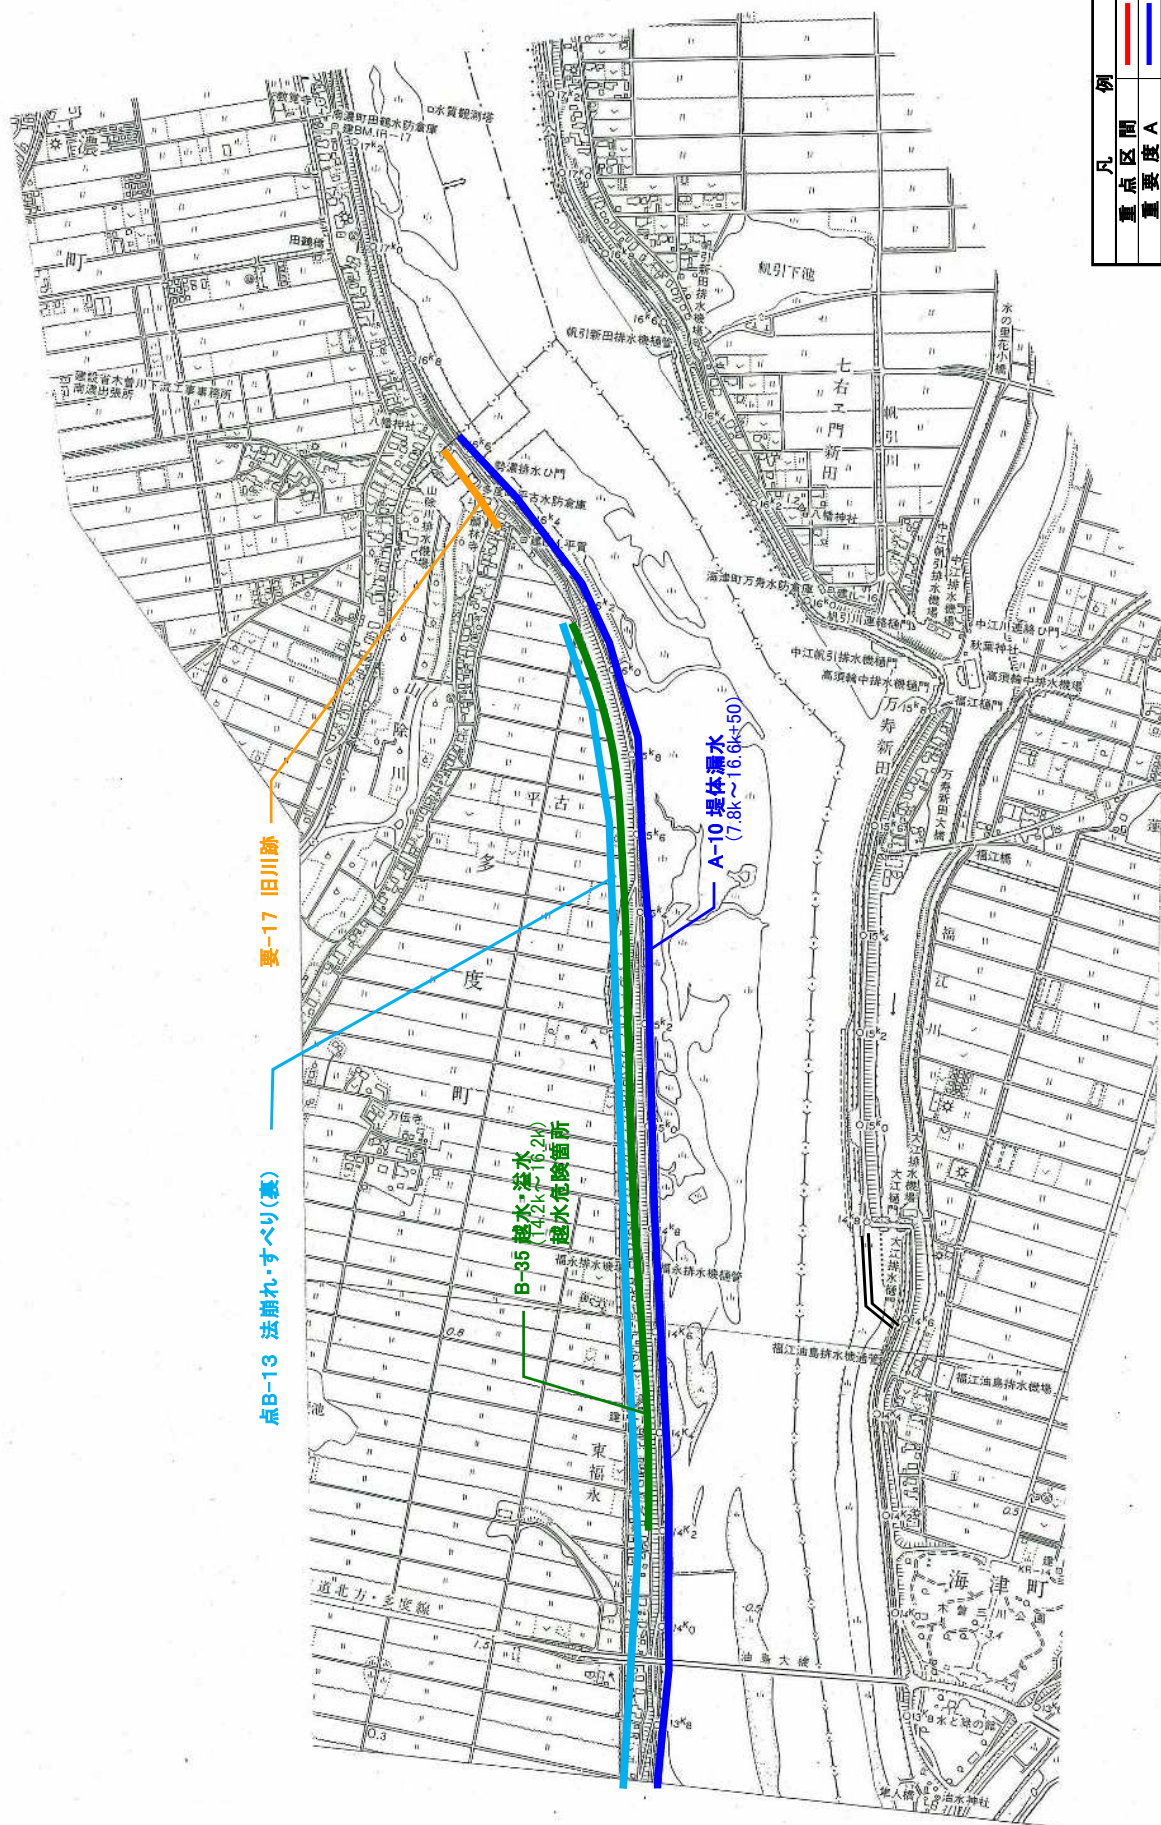


凡 例
重点区間
重要度 A
重要度 B
要注意箇所
堤防崩壊点(重要度B)

1 : 10,000



令和7年3月作成

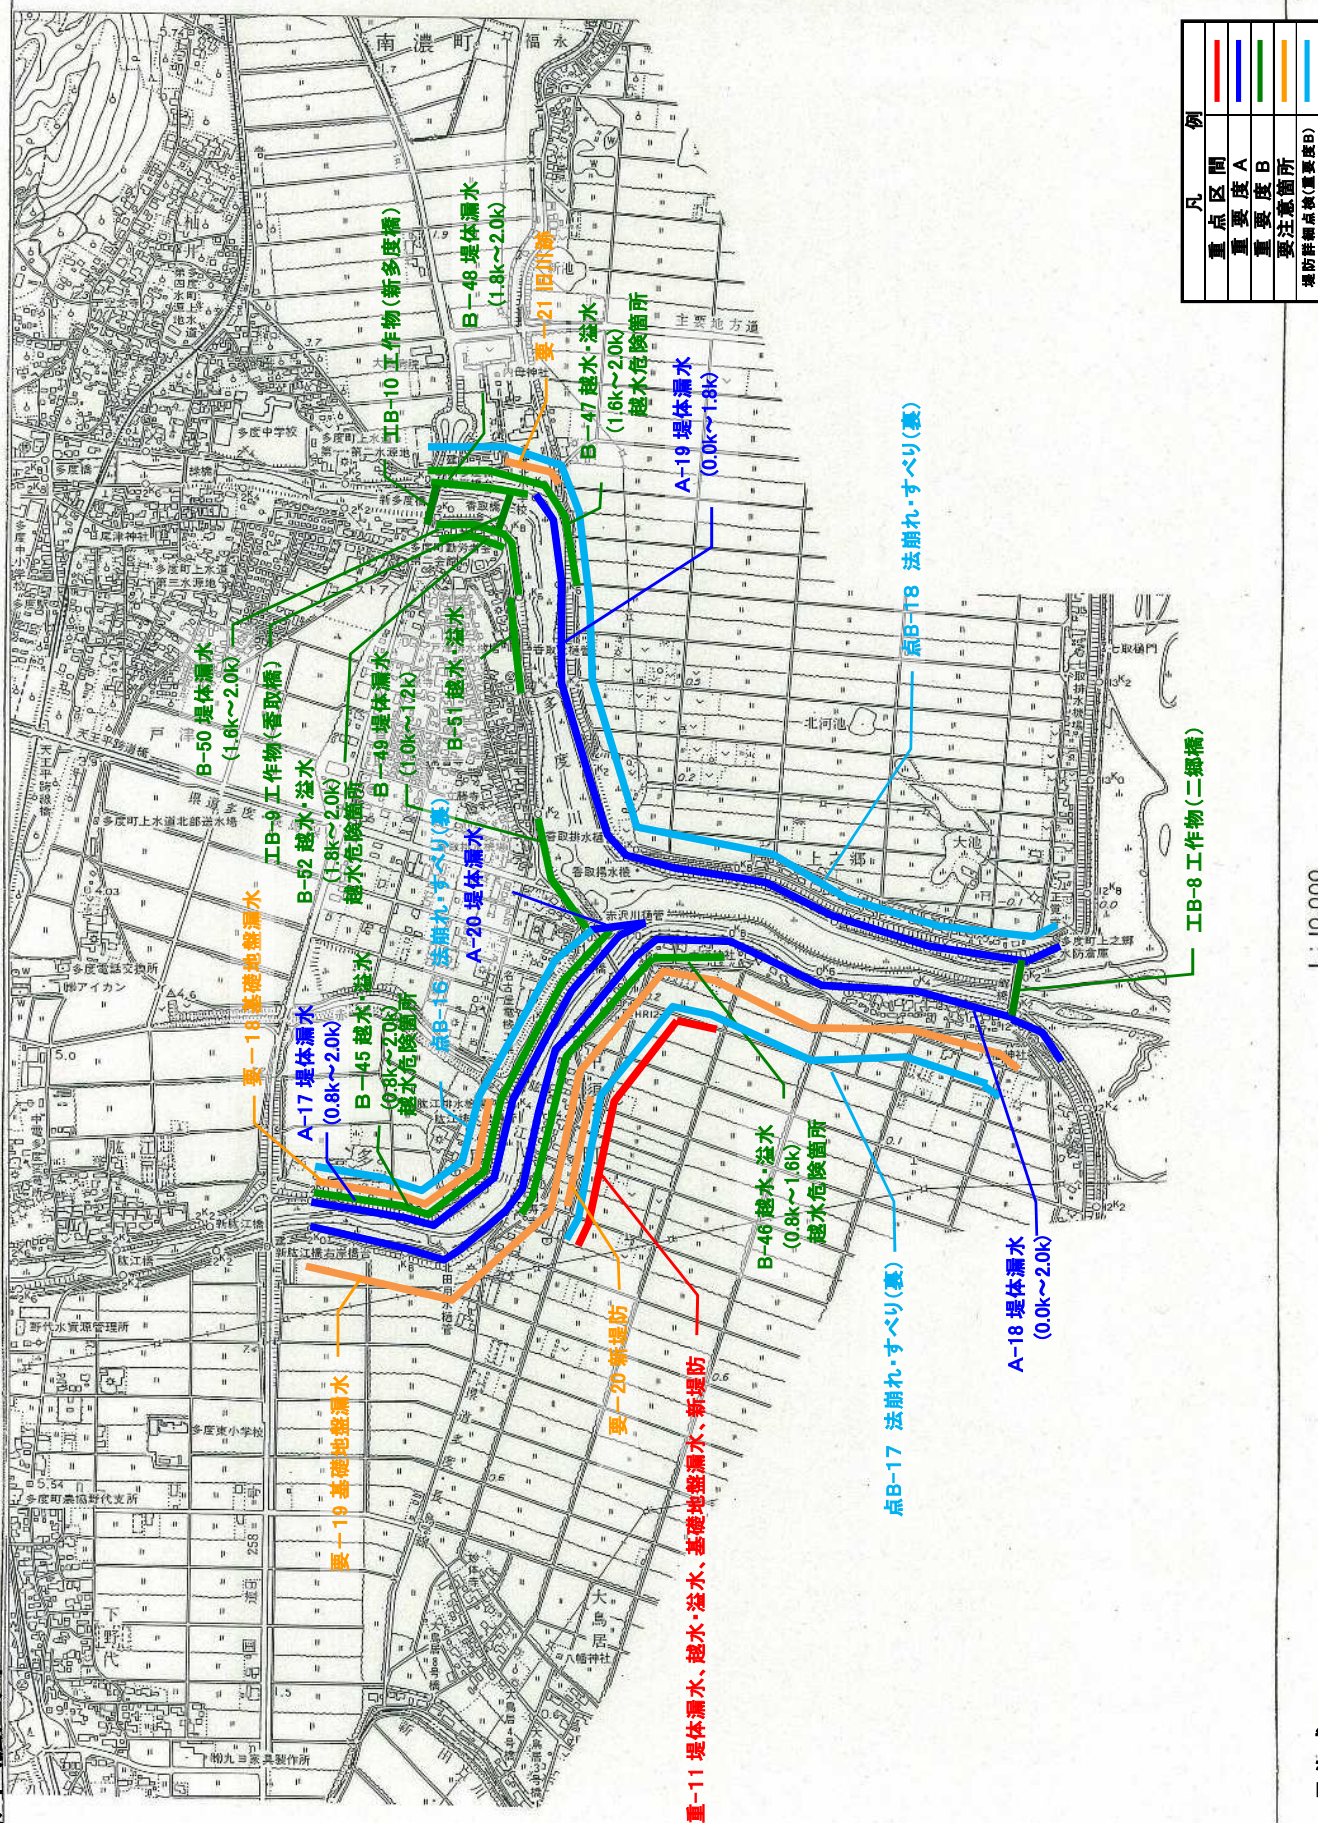

令和7年3月作成
